



NEWSLETTER n°5

17 décembre 2020

Chères Amies,
Chers Amis,

Je résume la situation actuelle du chantier :

TRAVAUX EN COURS

La structure du bâtiment est maintenant en place dans son entièreté.

Comme vous le savez, l'immeuble est, dans son ensemble, composé de panneaux « CLT » (*Cross Laminated Timber*), c'est-à-dire, d'épais panneaux de bois massif disposé en multicouches croisées.

Les façades seront ultérieurement isolées et recouvertes d'un bardage en cèdre prétraité.

En ce qui concerne les toitures, les travaux d'isolation et d'étanchéité des toitures plates sont achevés.

Les ouvriers terminent de placer la couche d'étanchéité sur les toitures cintrées.

D'autre part, à l'intérieur du bâtiment, toutes les canalisations électriques et hydrauliques qui doivent être encastrées dans le sol sont placées.

Comme vous le verrez sur les photos en annexe, les ouvriers sont occupés à terminer la pose des chapes.

Enfin, tous les châssis sont placés, à part le système de porte d'entrée.

Les congés de la construction commencent lundi prochain et le chantier reprendra lundi 4 janvier 2021.

Comme espéré le bâtiment aura pu être rendu étanche et protégé pendant cette période.


Vous trouverez ci-après quelques photos prises récemment.

Je vous tiendrai informé du suivi.

Amitiés,

Jean-Jacques



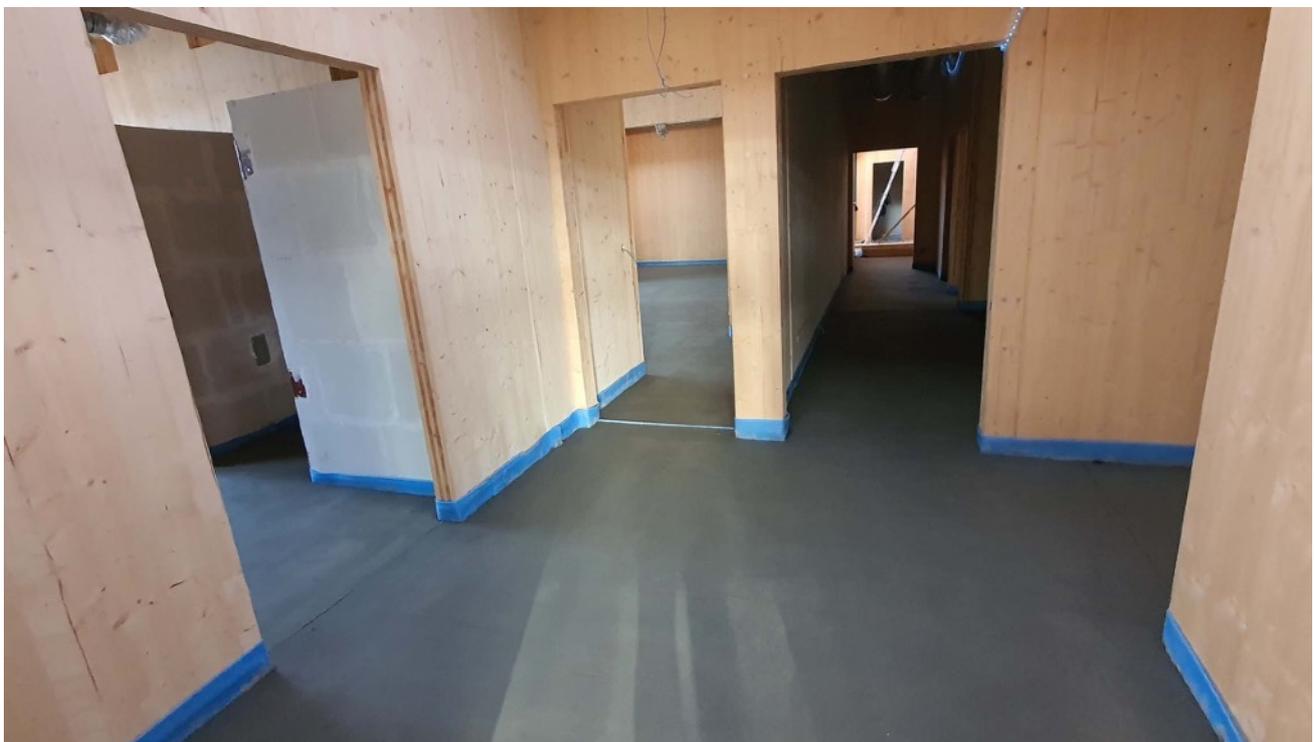





SALLE POLYVALENTE

